



若葉の候、地域の皆様方におかれましては、ますますのご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、RDF化施設解体工事は3月下旬より現場事務所の設置および事前調査に着手しております。5月から当工事に着手し、解体施設範囲内の試掘調査・建物調査・仮囲い設置・計量棟解体作業を予定しております。

安全第一で工事を進めてまいりますので、皆様方のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

上空写真



解体・撤去の施設を上空から撮影



全体施工フロー

工期：令和6年2月5日～令和8年11月30日



進捗率
0.2%

工事進捗

令和6年5月工程表

工種・種別	令和6年5月度																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
準備工事																															
建物調査																															
試掘調査																															
仮設工事																															
仮囲い設置																															
付帯施設解体工事																															
計量棟解体																															

施工状況



現場事務所
設置箇所






初夏の候、地域の皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、RDF化施設解体工事は5月上旬より解体施設範囲内の試掘調査・建物調査・仮囲い設置・計量棟解体作業に着手しております。6月からはアスベスト対策工事、内装材撤去等（RDF化施設内）作業を予定しております。

安全第一で工事を進めてまいりますので、皆様方のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

計量棟付近の交通規制について


解体工事に伴い、令和6年5月20日～令和8年11月30日の間、計量棟付近の交通規制を行います。近隣住民の皆様やモノコトショップなど管理棟をご利用の方々にはご不便おかけいたしますが、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。

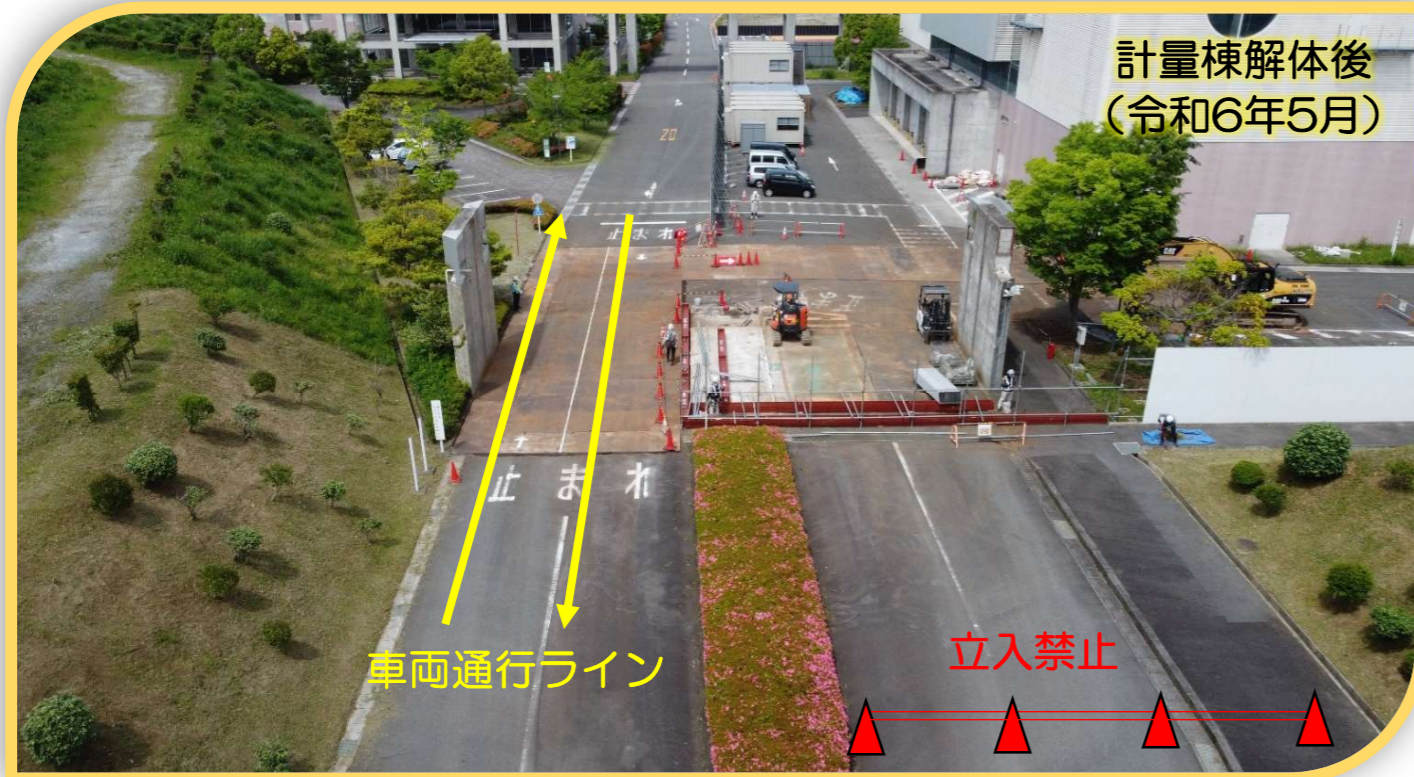

～交通規制イメージ写真～

全体施工フロー

工期：令和6年2月5日～令和8年11月30日

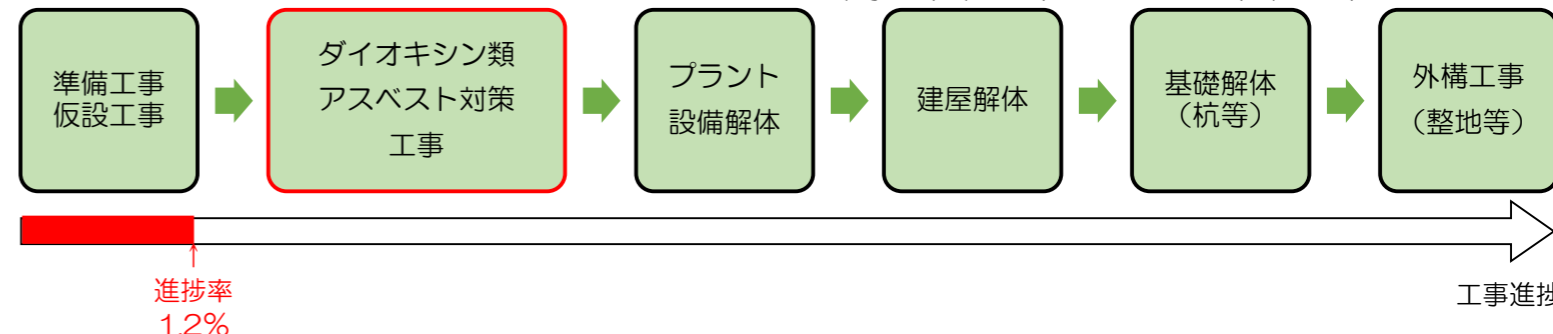

令和6年6月工程表

工種・種別	令和6年6月度																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
除染用仮設工事																															
内壁アスベスト 仮設足場																															
除染工事																															
石綿除染工事																															
建屋解体工事																															
内装材撤去																															
付帯設備撤去																															

施工状況

RDF化施設棟 仮囲いの設置 (令和6年5月)



