



春風の候、地域の皆様方におかれましては、ますますのご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、RDF化施設解体工事は3月に引き続き、プラント設備解体工事に着手しております。4月はプラント設備解体工事、外部足場の一部撤去を予定しております。

地域の皆様方にはご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

上空写真



RDF化施設棟
(令和7年3月)

大気測定状況(石綿・
ダイオキシン類)↓




～環境測定項目～ サンプルングを適切に行い、基準値を遵守します。

測定対象	調査項目	サンプリング箇所	基準値
周辺大気	ダイオキシン類	敷地内4箇所	0.6pg-TEQ/g
	石綿	敷地内4箇所	10本/L
周辺土壌	ダイオキシン類	敷地内4箇所	1000pg-TEQ/g
騒音・振動	騒音	敷地内2箇所	85db
	振動	敷地内2箇所	75db

※騒音・振動連続測定中、基準値超えなし

全体施工フロー

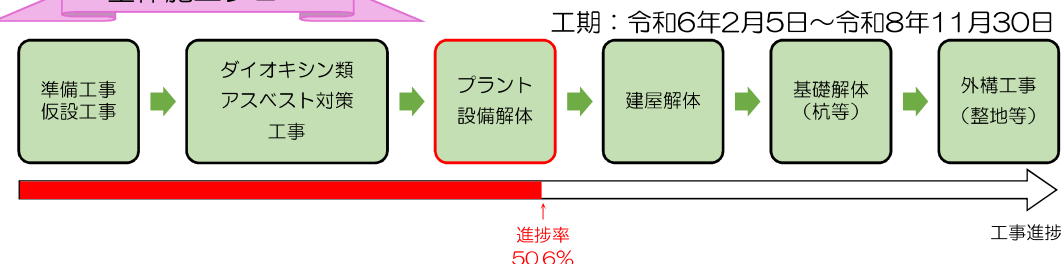

令和7年4月工程表

	令和7年4月度																													
工種・種別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
建屋解体工事																														
プラント設備解体																														
除染用仮設工事																														
仮設足場撤去																														


施工状況



プラント設備解体



プラント設備解体工事では、大型の重機を使って各階の設備や梁の解体を行っています。



新緑の候、地域の皆様方におかれましては、ますますのご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、RDF化施設解体工事は4月でプラント設備解体工事が完了しました。5月からは除染用仮設物の撤去と建屋解体を予定しております。

地域の皆様方にはご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

上空写真



RDF化施設棟
(令和7年4月)

～環境測定項目～ サンプリングを適切に行い、基準値を遵守します。


測定対象	調査項目	サンプリング箇所	基準値
周辺大気	ダイオキシン類	敷地内4箇所	0.6pg-TEQ/g
	石綿	敷地内4箇所	10本/L
周辺土壌	ダイオキシン類	敷地内4箇所	1000pg-TEQ/g
騒音・振動	騒音	敷地内2箇所	85db
	振動	敷地内2箇所	75db

※騒音・振動連続測定中、基準値超えなし

大気測定状況（石綿・
ダイオキシン類）↓



全体施工フロー

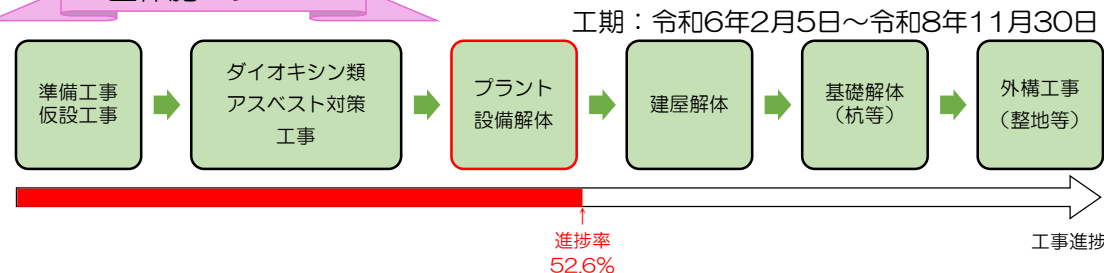

令和7年5月工程表

	令和7年5月度																																	
工種・種別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
建屋解体工事																																		
建屋解体																																		
除染用仮設工事																																		
除染用仮設物撤去																																		

施工状況

プラント設備解体



プラント設備解体工事では、各階の設備や梁の解体が完了しました。



向夏の候、地域の皆様方におかれましては、ますますのご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、RDF化施設解体工事は5月から除染用仮設物撤去と建屋解体を行っています。6月は引き続き建屋解体を予定しております。

地域の皆様方にはご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

上空写真



RDF化施設棟
(令和7年5月)

～環境測定項目～ サンプルングを適切に行い、基準値を遵守します。


測定対象	調査項目	サンプリング箇所	基準値
周辺大気	ダイオキシン類	敷地内4箇所	0.6pg-TEQ/g
	石綿	敷地内4箇所	10本/L
周辺土壌	ダイオキシン類	敷地内4箇所	1000pg-TEQ/g
	騒音・振動	敷地内2箇所	85db
騒音・振動	振動	敷地内2箇所	75db

※騒音・振動連続測定中、基準値超えなし

作業環境測定状況 (ダイオキシン類)



全体施工フロー

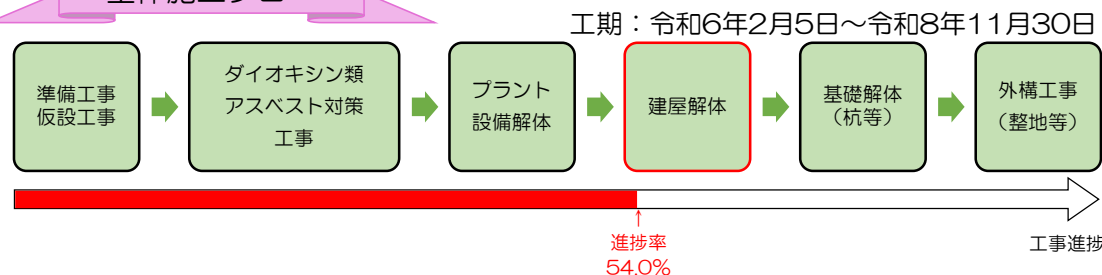

令和7年6月工程表

	令和7年6月度																													
工種・種別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
建屋解体工事																														
建屋解体																														
除染用仮設工事																														
外部養生足場組立・解体																														

施工状況

建屋解体



除染用仮設撤去



ダイオキシン類対策工事が終わり仮設物の撤去を行っています。また、大型重機による建屋解体が始まりました。



盛夏の候、地域の皆様方におかれましては、ますますのご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、RDF化施設解体工事は6月から建屋解体を行っております。7月は建屋の南側から内部にかけて順次解体を予定しています。

地域の皆様方にはご迷惑をおかけしますが、騒音・振動等に十分留意して工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

上空写真



RDF化施設棟
(令和7年6月)

～環境測定項目～ サンプリングを適切に行い、基準値を遵守します。


測定対象	調査項目	サンプリング箇所	基準値
周辺大気	ダイオキシン類	敷地内4箇所	0.6pg-TEQ/g
	石綿	敷地内4箇所	10本/L
周辺土壌	ダイオキシン類	敷地内4箇所	1000pg-TEQ/g
騒音・振動	騒音	敷地内2箇所	85db
	振動	敷地内2箇所	75db

※騒音・振動連続測定中、基準値超えなし

環境測定状況 (騒音・振動)



全体施工フロー

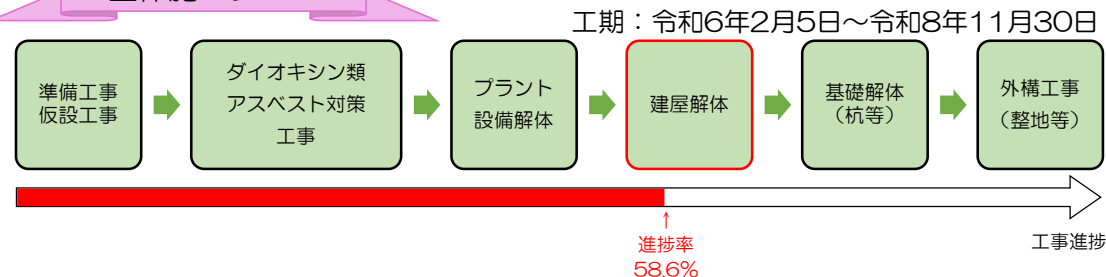

令和7年7月工程表

	令和7年7月度																														
工種・種別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
建屋解体工事																															
建屋解体																															
除染用仮設工事																															
外部養生足場組立・解体																															

施工状況

建屋解体



大型重機による建屋解体が本格的に始まりました。現在、建屋の南側を解体しています。



盛夏の候、地域の皆様方におかれましては、ますますのご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、RDF化施設解体工事は6月から引き続き、建屋解体工事を行っております。8月は建屋解体工事および地下部の解体を予定しております。

地域の皆様方にはご迷惑をおかけしますが、周辺環境に十分留意して工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

上空写真



RDF化施設棟
(令和7年7月)

～環境測定項目～ サンプリングを適切に行い、基準値を遵守します。


測定対象	調査項目	サンプリング箇所	基準値
周辺大気	ダイオキシン類	敷地内4箇所	0.6pg-TEQ/g
	石綿	敷地内4箇所	10本/L
周辺土壌	ダイオキシン類	敷地内4箇所	1000pg-TEQ/g
騒音・振動	騒音	敷地内2箇所	85db
	振動	敷地内2箇所	75db

※騒音・振動連続測定中、基準値超えなし

環境測定状況 (ダイオキシン類)



全体施工フロー

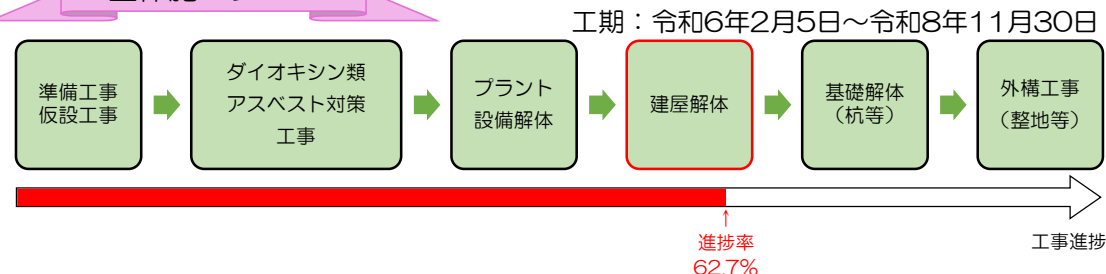

令和7年8月工程表

	令和7年8月度																																
工種・種別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
建屋解体工事																																	
建屋解体									夏季休業																								
土間基礎・地中梁解体																																	

施工状況

建屋解体



複数の大型重機による建屋解体を行っています。現在、建屋の北側を解体しています。



秋暑の候、地域の皆様方におかれましては、ますますのご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、RDF化施設解体工事は7月から引き続き、建屋解体工事を行っております。9月は地下構造物の解体を予定しております。

地域の皆様方にはご迷惑をおかけしますが、周辺環境に十分留意して工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

上空写真



RDF化施設棟
(令和7年8月)

～環境測定項目～ サンプリングを適切に行い、基準値を遵守します。


測定対象	調査項目	サンプリング箇所	基準値
周辺大気	ダイオキシン類	敷地内4箇所	0.6pg-TEQ/g
	石綿	敷地内4箇所	10本/L
周辺土壌	ダイオキシン類	敷地内4箇所	1000pg-TEQ/g
騒音・振動	騒音	敷地内2箇所	85db
	振動	敷地内2箇所	75db

※騒音・振動連続測定中、基準値超えなし

環境測定状況
(騒音・振動)



全体施工フロー

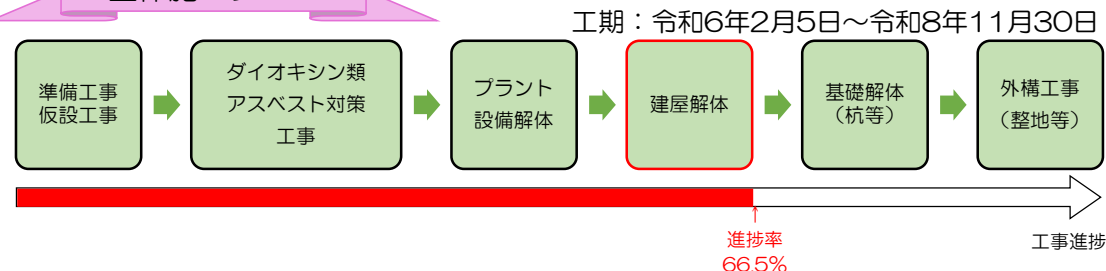

令和7年9月工程表

	令和7年9月度																														
工種・種別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
地下構造物解体工事																															
土間基礎・地中梁解体																															

施工状況

建屋解体（北面）



建屋解体（西面）



複数の大型重機による建屋解体を行っています。8月末ですべての壁の解体が完了しました。
