

早春の候、地域の皆様方におかれましては、ますますのご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、RDF化施設解体工事は3月は施設棟の土間基礎の解体、施設棟の基礎杭の撤去、旧計量棟地下の埋戻し・道路舗装を行いました。4月は施設棟の基礎杭の撤去を引き続き行います。地域の皆様方にはご迷惑をおかけしますが、周辺環境に十分留意して工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

上空写真



RDF化施設棟
(令和8年3月)

～環境測定項目～ サンプルングを適切に行い、基準値を遵守します。


測定対象	調査項目	サンプリング箇所	基準値
周辺大気	ダイオキシン類	敷地内4箇所	0.6pg-TEQ/g
	石綿	敷地内4箇所	10本/L
周辺土壌	ダイオキシン類	敷地内4箇所	1000pg-TEQ/g
騒音・振動	騒音	敷地内2箇所	85db
	振動	敷地内2箇所	75db

※騒音・振動連続測定中、基準値超えなし

環境測定状況 (騒音・振動)



全体施工フロー

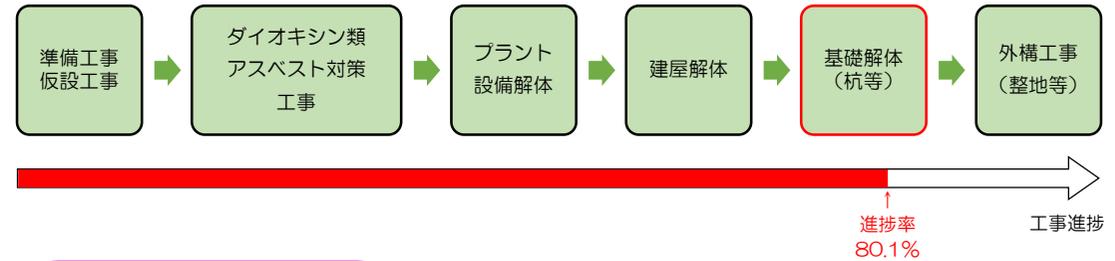

令和8年4月工程表

工種・種別	令和8年4月度																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
地下構造物解体工事																														
施設棟杭基礎撤去																														
整地工事																														
施設棟土砂埋戻し																														

施工状況

施設棟土間基礎・地中梁解体



土間基礎・地中梁の解体は3月末で終了し、施設棟の解体は杭撤去を残して他は全て完了しました。令和8年度は施設棟の杭撤去、整地、外構工事を行います。

旧計量棟西側道路舗装

